

**PORTAL WEB: PROYECTOS/MANTENIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE SAN MARTIN**

**PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**

**+ POR CONVENIOS TRANSFERIDOS AL PLIEGO DE GOBIERNOS LOCALES.**

**1. Construcción del Puente Vehicular sobre la Quebrada Shapilleja en el km 12+880 de la carretera que une la localidad de Buenos Aires con Santa Rosillo, Distrito de Buenos Aires-Picota-San Martín.**

- a. N° DE CONTRATO : CONTRATO DE OBRA N° 048 - 2015
- b. TIPO DE PROCESO : ADP N°006-2015
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO SHAPILLEJA
- d. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 8/12/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 120 Días
- g. INICIO : 29/12/2015
- h. FIN : 26/04/2016
- i. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 04 Días (27/04/2016 al 30/04/2016)
- j. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA I : 30/04/2016
- k. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 : 13 Días (01/05/2016 al 13/05/2016)
- l. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA II : 13/05/2016
- m. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 : 20 Días (14/05/2016 al 02/06/2016)
- n. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA III : 02/06/2016
- o. PARALIZACIÓN DE OBRA N° 01 : 45 DIAS (24/06/16 al 07/07/16)
- p. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA IV : 17/07/2016

ESTADO SITUACIONAL					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Enero	1'540,127.11	503,744.59	32.71%	32.71%	En Ejecución
Mes de Febrero		295,716.24	19.20%	51.91%	
Mes de Marzo		243,914.68	15.84%	67.75%	
Mes de Abril		183,814.35	11.94%	79.69%	
Mes de Mayo		191,264.85	12.42%	92.10%	
Mes de Junio		PARALIZADO	-	-	
Mes de Julio		121,672.40	7.90%	100.00%	
<b>TOTAL</b>			<b>1'540,127.11</b>	<b>Saldo</b>	



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**2. Rehabilitación, Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Santa Rosa - Lucero, Distrito de Soritor – Moyobamba - San Martín.**

- a. N° DE CONTRATO : CONTRATO DE OBRA N° 001 - 2016
- b. TIPO DE PROCESO : LP N°002-2015
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL FABI
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 11/01/2016
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 180 Días
- g. INICIO : 04/04/2016
- h. FIN : 30/09/2016

ESTADO SITUACIONAL					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Abril	4'731,401.10	457,342.47	11.41%	11.41%	En Ejecución
Mes de Mayo		349,725.23	8.72%	20.13%	
Mes de Junio		998,450.31	24.90%	45.03%	
<b>TOTAL</b>		<b>1'805,518.01</b>	<b>Saldo</b>		<b>2'925,883.09</b>



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**3. Mejoramiento de Vías Vecinales en el Caserío de Solo, Distrito de Shanao – Lamas - San Martín.**

- a. N° DE CONTRATO : CONTRATO DE OBRA N° 006 - 2015
- b. TIPO DE PROCESO : ADP N°007-2015
- c. CONTRATISTA : EMPRESA MULTISERVICIOS LA MARGINAL E.I.R.L.
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 30/12/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 150 Días
- g. INICIO : 15/01/2016
- h. FIN : 12/06/2016
- i. PARALIZACIÓN DE OBRA N° 01 : 20 Días (06/05/2016 al 25/05/2016)
- j. FECHA DE REINICIO DE OBRA : 26/05/2016
- k. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 02/07/2016
- l. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 14 D.C. (03/07/2016 al 16/07/2016)
- m. FECHA DE REINICIO DE OBRA : 03/07/2016
- n. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 16/07/2016
- o. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 : 35 D.C. (17/07/2016 al 20/08/2016)
- p. FECHA DE REINICIO DE OBRA : 17/07/2016
- q. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 20/08/2016
- r. PARALIZACIÓN DE OBRA N° 02 : 11 Días (21/08/2016 al 31/08/2016)
- s. FECHA DE REINICIO DE OBRA : 01/09/2016

ESTADO SITUACIONAL					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Enero	1'345,280.00	88,230.40	6.56%	6.56%	En Ejecución
Mes de Febrero		189,423.36	14.08%	20.64%	
Mes de Marzo		200,340.34	14.89%	35.53%	
Mes de Abril		128,749.98	9.57%	45.10%	
Mes de Mayo		90,414.04	6.72%	51.82%	
Mes de Junio		24,854.75	1.85%	53.67%	
Mes de Julio		20,637.82	1.53%	55.20%	
<b>TOTAL</b>		<b>742,650.69</b>	<b>Saldo</b>		<b>602,629.31</b>





“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**4. Mejoramiento de la Trocha Carrozable Sector Ponguito Morillo, Distrito de Shanao, Lamas – San Martín.**

- a. MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
- b. PLAZO (D.C.) : 90 Días
- c. INICIO : 20/11/2015
- d. FIN : 17/02/2016

ESTADO SITUACIONAL					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Noviembre	330,976.11	8,009.62	2.42%	2.42%	Finalizada
Mes de Diciembre		36,010.20	10.88%	13.30%	
Mes de Enero		267,461.79	80.81%	94.11%	
Mes de Febrero		19,494.49	5.89%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>330,976.10</b>		<b>Saldo</b>	<b>0.01</b>



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**POR UNIDAD EJECUTORA Y FORMULADORA DRTC-SM**

**1. Mejoramiento del Servicio de Emisión de Licencias de Conducir y Permiso de Operación Vehicular de la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones - Alto Mayo DRTC -SM Moyobamba, Moyobamba - San Martín.**

a. N° DE CONTRATO	:	CONTRATO DE OBRA N° 005-2015
b. TIPO DE PROCESO	:	ADS N° 026-2015
c. CONTRATISTA	:	CONSORCIO VIAL MOYOBAMBA
d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	:	22/12/2015
e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	CONTRATA
f. PLAZO (D.C.)	:	75 Días
g. INICIO	:	01/03/2016
h. FIN	:	14/05/2016
i. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	:	27 Días
j. NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	:	10/06/2016
k. PARALIZACIÓN DE OBRA N° 01	:	20/05/2016 a la fecha.
l. ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01	:	S/. 42,500.00 (EN PROCESO DE APROBACION)

ESTADO SITUACIONAL					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Marzo	735,000.00	212,682.72	28.94%	28.94%	En Ejecución
Mes de Abril		138,084.23	18.79%	47.73%	
Mes de Mayo		17,983.90	2.45%	<b>50.18%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>368,750.85</b>	<b>Saldo</b>		<b>366,249.15</b>




“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**2. Mejoramiento del Servicio de Emisión de Licencias de Conducir y Permiso de Operación Vehicular de la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones - Bajo Mayo DRTC -SM Tarapoto, San Martín - San Martín.**

- a. N° DE CONTRATO : CONTRATO DE OBRA N° 004-2015
- b. TIPO DE PROCESO : ADS N° 025-2015
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL TARAPOTO
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 22/12/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 75 Días
- g. INICIO : 11/01/2016
- h. FIN : 25/03/2016
- i. PARALIZACIÓN DE OBRA N° 01 : 32 Días (18/03/2016 al 18/04/2016)
- j. FECHA DE REINICIO DE OBRA : 19/04/2016
- k. NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA II: 26/04/2016
- l. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 12 Días (27/04/2016 al 08/05/2016)
- m. NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA III: 08/05/2016
- n. ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01: S/. 442,822.32 (EJECUTADO AL 100%)

ESTADO SITUACIONAL					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Enero	814,200.00	198,664.80	24.40%	24.40%	Finalizado
Mes de Febrero		140,938.02	17.31%	41.71%	
Mes de Marzo		16,772.52	2.06%	43.77%	
Mes de Abril		199,071.90	24.45%	68.22%	
Mes de Mayo		258,752.76	31.78%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>814,200.00</b>	<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>

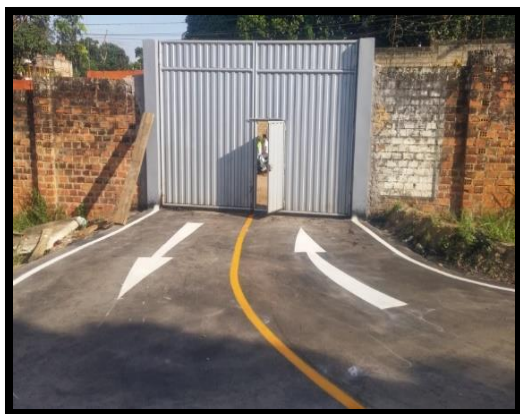



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**3. Mejoramiento del Servicio de Emisión de Licencias de Conducir y Permiso de Operación Vehicular de la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones - Huallaga Central DRTC -SM Juanjuí, Mariscal Cáceres - San Martín.**

- a. N° DE CONTRATO : CONTRATO DE OBRA N° 003-2015
- b. TIPO DE PROCESO : ADS N° 024-2015
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO AF&L CONSTRUCTORES
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 22/12/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 90 Días
- g. INICIO : 11/01/2016
- h. FIN : 09/04/2016
- i. PARALIZACIÓN DE OBRA N° 01 : 27 Días (23/03/2016 al 18/04/2016)
- j. FECHA DE REINICIO DE OBRA : 19/04/2016
- k. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 10/05/2016

ESTADO SITUACIONAL					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Enero	560,800.00	190,819.42	34.03%	34.03%	El monto de S/. 45,233.84 es el deductivo que se origina
Mes de Febrero		36,053.04	6.43%	40.46%	
Mes de Marzo		25,540.99	4.55%	45.01%	
Mes de Abril		156,788.51	27.96%	72.97%	
Mes de Mayo		106,364.20	18.97%	<b>91.94%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>515,566.16</b>		<b>Saldo</b>	<b>45,233.84</b>



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**4. Recuperación y Mejoramiento de Zonas Críticas de la carretera Departamental Ruta SM-104, Tramo: Lamas - Emp, PE-5N (Pte. Bolivia), Provincia de Lamas - Región San Martín.**

- a. N° DE CONTRATO : CONTRATO DE OBRA N° 002-2015
- b. TIPO DE PROCESO : LP N°001-2015
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO YARICU
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 21/12/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 120 Días
- g. INICIO : 25/01/2016
- h. FIN : 23/05/2016
- i. PARALIZACIÓN DE OBRA N° 01 : 24 Días (22/03/2016 al 14/04/2016)
- j. FECHA DE REINICIO DE OBRA : 15/04/2016
- k. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA I : 16/06/2016
- l. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 17 Días (17/06/2016 al 03/07/2016)
- m. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA II : 03/07/2016
- n. AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 : 11 Días (04/07/2016 al 14/07/2016)
- o. NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA III : 14/07/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Enero	2'320,564.00	588,878.93	26.06%	26.06%	En Ejecución
Mes de Febrero		426,113.91	18.85%	44.91%	
Mes de Marzo		53,832.03	2.38%	47.29%	
Mes de Abril		285,695.16	12.64%	59.93%	
Mes de Mayo		349,418.54	15.46%	75.39%	
Mes de Junio		308,858.64	13.73%	89.13%	
<b>TOTAL</b>		<b>2'012,083.27</b>	<b>Saldo</b>		<b>308,480.73</b>





“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**MANTENIMIENTOS DE VIAS**

 PIM 2016.

**1. Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental, Ruta SM-106, Tramo: EMP. PE-05N (Pte. Colombia) - Shapaja - Chazuta, Prog. Km 00+000 al Km 29+869, L= 29.869.**

- a. MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
- b. PLAZO (D.C.) : 150 Días
- c. INICIO : 04/01/2016
- d. FIN : 31/05/2016
- e. ADICIONALN° 01 : S/. 28,260.00 (EJECUTADO AL 100% DEL 02/05/16-29/06/16)

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Enero	885,000.00	41,595.00	4.70%	4.70%	Finalizada
Mes de Febrero		386,656.50	43.69%	48.39%	
Mes de Marzo		202,842.00	22.92%	71.31%	
Mes de Abril		82,482.00	9.32%	80.63%	
Mes de Mayo		61,419.00	6.94%	87.57%	
Mes de Junio		110,005.50	12.43%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>885,000.00</b>	<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**2. Mantenimiento Rutinario de la Carretera Departamental Ruta SM-103, Tramo: PE -5N (Sacanche - El Eslabón - Piscoyacu - Saposoa, L=21.70 Km.**

- a. DE CONTRATO : N°017-2016-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO SACANCHE
- d. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 28/04/2016
- e. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 180 Días
- g. INICIO : 04/05/2016
- h. FIN : 31/10/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Mayo	84,740.00	14,147.30	16.69%	16.69%	En Ejecución
Mes de Junio		16,603.63	19.59%	36.29%	
Mes de Julio		16,612.17	19.60%	55.89%	
<b>TOTAL</b>		<b>47,363.09</b>	<b>Saldo</b>		<b>37,376.91</b>



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**3. Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental, Ruta SM-107, Tramo: Emp. PE-5N (Picota) - Tingo de Ponaza, Prog. Km 00+000 al Km 19+500, L= 19.50 Km.**

- a. DE CONTRATO : N°022-2016-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO PICOTA
- d. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 06/06/2016
- e. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 15 Días
- g. INICIO : 01/07/2016
- h. FIN : 15/07/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Julio	90,000.00	90,000.00	100.00%	100.00%	Finalizada
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>





“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**4. Mantenimiento Rutinario, Ruta SM-104, Tramo: Emp. PE-5N (Pte. Bolivia) Lamas - Emp. PE-5N (Dv. Lamas), Prog. Km 00+000 al Km 23+180, L= 23.18 Km.**

- a. DE CONTRATO : N° 018-2016-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO LAMAS
- d. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 28/04/2016
- e. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 120 Días
- g. INICIO : 05/05/2016
- h. FIN : 02/09/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Mayo	72,000.00	15,884.88	22.06%	22.06%	En Ejecución
Mes de Junio		21,196.67	29.44%	51.50%	
Mes de Julio		19,289.74	26.79%	78.29%	
<b>TOTAL</b>		<b>56,371.29</b>	<b>Saldo</b>		<b>37,081.55</b>



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**5. Prevención y Atención de Emergencias Viales, Intervención 1000, San Martín, Lamas, San Roque de Cumbaza.**

- a. DE CONTRATO : N° 019-2016-GRSM/DRTC-SM
- b. CONTRATISTA : INMOBILIARIA ALTAVISTA E.I.R.L
- c. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- d. PLAZO (D.C.) : 28 Días
- e. INICIO : 03/05/2016
- f. FIN : 31/05/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Mayo	31,000.00	31,000.00	100.00%	100.00%	Finalizada
<b>TOTAL</b>		<b>31,000.00</b>	<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**6. Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera Departamental, Ruta SM-116, Tramo: EMP. SM-116 Urkupata - Chunquihui Prog. Km 00+000 al Km 11+400 Kilometro: 11.40 San Martin, Lamas, San Roque de Cumbaza.**

- a. DE CONTRATO : N° 020-2016-GRSM/DRTC-SM
- b. CONTRATISTA : INMOBILIARIA ALTAVISTA E.I.R.L
- c. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 28/04/2016
- d. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- e. PLAZO (D.C.) : 120 Días
- f. INICIO : 03/05/2016
- g. FIN : 31/05/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Mayo	19,000.00	19,000.00	100.00%	100.00%	Finalizada
<b>TOTAL</b>		<b>19,000.00</b>	<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>





“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

CONVENIO N° 224-2016-MTC/21

**1. Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental Ruta SM - 102, Tramo: Emp. PE - 5N (Cuñumbuque) - San José de Sisa, Prog km 29 + 220, L = 29.220 Km.**

- a. DE CONTRATO : N° 006-2016-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : CP N° 002
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO SISA
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 19/01/2016
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 105 Días
- g. INICIO : 02/02/2016
- h. FIN : 16/05/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Febrero	1'856,000.00	451,351.83	24.32%	24.32%	Deductivo (No se ejecutó sectores con fallas geológicas)
Mes de Marzo		668,733.63	36.03%	60.35%	
Mes de Abril		392,209.94	21.13%	81.48%	
Mes de Mayo		120,646.29	06.50%	87.98%	
Mes de Junio		74,611.20	04.02%	92.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>1'707,552.89</b>	<b>Saldo</b>		<b>148,447.11</b>




“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**2. Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental Ruta SM-100, Tramo: Jepelacio-Barranquita-Nvo. San Miguel-Carrizales; Prog. Km 12+000 al Km 31+000, L= 19.00 km.**

- a. DE CONTRATO : N° 005-2016-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : CP N° 004
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO CARRIZALES
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 15/01/2016
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 90 Días
- g. INICIO : 01/02/2016
- h. FIN : 30/04/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Febrero	740,900.00	451,990.39	61.01%	61.01%	Finalizada
Mes de Marzo		114,030.10	15.39%	76.40%	
Mes de Abril		174,879.51	23.60%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>740,900.00</b>	<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>

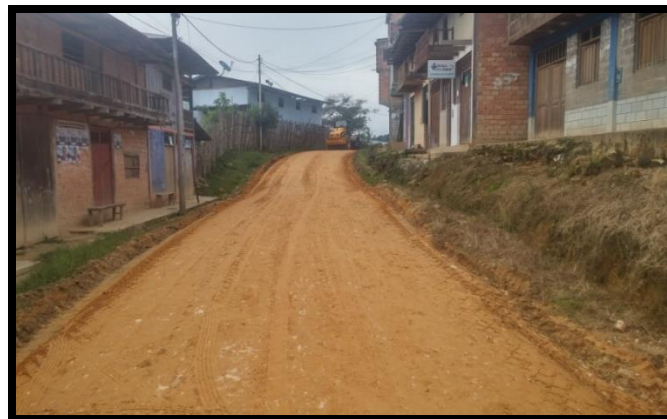

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**3. Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental Ruta SM-103, Tramo: PE -5N (Sacanche) - El Eslabon - Piscoyacu - Saposoa, L= 0.92 km.**

- a. DE CONTRATO : N° 007-2016-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : ADS N° 033
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO CKA GARCAM
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 20/01/2016
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 30 Días
- g. INICIO : 09/02/2016
- h. FIN : 09/03/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Febrero	58,729.00	58,729.00	100.00%	100.00%	Finalizada
<b>TOTAL</b>		<b>58,729.00</b>	<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>





“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**4. Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental Ruta SM-100, Tramo: San Martín- Nvo. Pucacaca-Incaico-Sinami-Incaico, L= 14.20 Km.**

- a. DE CONTRATO : N° 004-2016-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : CP N° 003
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO INCAICO
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 15/01/2016
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 75 Días
- g. INICIO : 01/02/2016
- h. FIN : 30/04/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Febrero	556,175.00	380,389.14	68.39%	68.39%	Finalizada
Mes de Marzo		64,757.53	11.65%	80.04%	
Mes de Abril		111,028.33	19.96%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>556,175.00</b>	<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**5. Mantenimiento Rutinario de la Carretera Departamental Ruta SM-108, Tramo: EMP. SM-107 - DV. Pto. Rico -Nuevo Lima, Prog. Km 00+000 al Km 46+280., L= 46.280 km.**

- a. DE CONTRATO : N° 032-2015-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : AMC N° 014
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO IMNEMISAC
- d. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 27/10/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 210 Días
- g. INICIO : 06/11/2015
- h. FIN : 02/06/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Noviembre	230,615.60	27,454.24	11.90%	11.90%	Finalizada
Mes de Diciembre		32,945.09	14.29%	26.19%	
Mes de Enero		32,945.09	14.29%	40.48%	
Mes de Febrero		32,945.09	14.29%	54.77%	
Mes de Marzo		32,945.09	14.29%	69.06%	
Mes de Abril		32,945.09	14.29%	83.33%	
Mes de Mayo		38,435.91	16.67%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>230,615.60</b>	<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>	



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**6. Mantenimiento Rutinario de la Carretera Departamental Ruta SM-113, Tramo: Yuracyacu – Valle de la Conquista – Pueblo Libre – Ciro Alegría – Buenos Aires – La Florida – Pasamayo – Yantalo – Emp. PE-5N (Moyobamba), Prog. Km 12+600 al Km 56+580, L=43.98 Km.**

- a. DE CONTRATO : N° 031-2015-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : ADP N° 02
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO ALTO MAYO
- d. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 25/09/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 210 Días
- g. INICIO : 03/11/2015
- h. FIN : 31/05/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Noviembre	243,505.08	34,795.98	14.29%	14.29%	Finalizada
Mes de Diciembre		34,851.01	14.31%	28.60%	
Mes de Enero		34,792.42	14.29%	42.89%	
Mes de Febrero		34,792.42	14.29%	57.18%	
Mes de Marzo		34,792.42	14.29%	71.47%	
Mes de Abril		34,792.23	14.29%	85.76%	
Mes de Mayo		32,469.86	13.33%	99.09%	
Mes de Junio		2,218.74	13.33%	99.09%	
<b>TOTAL</b>		<b>243,505.08</b>		<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>





“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**7. Mantenimiento Rutinario de la Carretera Departamental Ruta SM-106, Tramo: EMP. PE-05N (Pte. Colombia) - Shapaja - Chazuta, Prog. Km 00+000 al Km 29+900, L= 29.90 Km"**

- a. DE CONTRATO : N° 033-2015 -GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : ADS N° 020
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO CHAZUTA
- d. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 27/10/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 210 Días
- g. INICIO : 16/12/2015
- h. FIN : 27/06/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Diciembre	143,500.00	21,614.43	15.06%	15.06%	Finalizada
Mes de Enero		20,920.32	14.58%	29.69%	
Mes de Febrero		21,492.38	14.98%	44.62%	
Mes de Marzo		21,171.05	14.75%	59.37%	
Mes de Abril		20,274.95	14.13%	73.50%	
Mes de Mayo		19,021.20	13.26%	86.26%	
Mes de Junio		19,005.67	13.24%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>143,500.00</b>	<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>	



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**8. Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Perfilado) de la Carretera Departamental  
Ruta SM-108, Tramo: Emp. SM-107 - Dv. Pto. Rico -Nuevo Lima, Prog. Km 00+000  
Al Km 49+200., L= 49.200 Km.**

- a. DE CONTRATO : N° 042-2015-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : CP N° 001
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO NUEVO LIMA
- d. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : 01/12/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 90 Días
- g. INICIO : 16/12/2015
- h. FIN : 13/03/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Diciembre	328,404.42	54,739.07	16.67%	16.67%	Finalizada
Mes de Enero		109,441.78	33.33%	50.00%	
Mes de Febrero		147,761.29	45.00%	95.00%	
Mes de Marzo		16,462.28	5.00%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>328,404.42</b>		<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**9. Mantenimiento Rutinario de la Carretera Departamental Ruta SM 102, Tramo Emp. PE-5N Dv. Cuñumbuque- San José de Sisa, Prog. Km. 00 000 al Km. 45 000, L= 45.00 Km.**

- a. DE CONTRATO : N°041-2015-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : ADP N° 004
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO NORPACIFIC
- d. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 01/12/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 180 Días
- g. INICIO : 02/12/2015
- h. FIN : 27/05/2016

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Diciembre	205,000.00	34,166.67	16.67%	16.67%	Finalizada
Mes de Enero		34,166.67	16.67%	33.04%	
Mes de Febrero		34,166.67	16.67%	50.01%	
Mes de Marzo		27,393.00	13.36%	63.37%	
Mes de Abril		34,166.67	16.67%	80.04%	
Mes de Mayo		40,940.32	19.96%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>205,000.00</b>		<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>





“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**10. Mantenimiento Rutinario Mecanizado Perfilado de la Carretera Departamental Ruta SM-113, Tramo: Yuracyacu - Valle de la Conquista - Pueblo Libre - Buenos Aires - La Florida – Pasamayo - Emp. PE-5N (Moyobmba), Prog. Km. 12+600 Al Km. 58+600 L= 46.00 Km.**

- a. DE CONTRATO : N°039-2015-GRSM/DRTC-SM
- b. TIPO DE PROCESO : ADP N° 005
- c. CONTRATISTA : CONSORCIO NORPACIFIC
- d. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 25/11/2015
- e. MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA
- f. PLAZO (D.C.) : 75 Días
- g. INICIO : 01/12/2015
- h. FIN : 13/02/2015

Estado Situacional					
Valorizaciones Mensuales	Presupuesto De Obra	Financiero	% Físico Actual	% Físico Acumulado	Observaciones
Mes de Diciembre	264,900.00	105,960.00	40.00%	40.00%	Finalizada.
Mes de Enero		105,960.00	40.00%	80.00%	
Mes de Febrero		52,980.00	20.00%	100.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>264,900.00</b>		<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>

